Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стражар при ТП"ДЛС-Тракия"
/име, фамилия./ подпис:
дата: 21.09.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10786/28.08.2014 г.**


Одобрил:

инж. Христо Шейтанов
име, фамилия./ подпис:
дата: 12.01.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12817 29.03.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **59** подотдел **в**
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/
Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

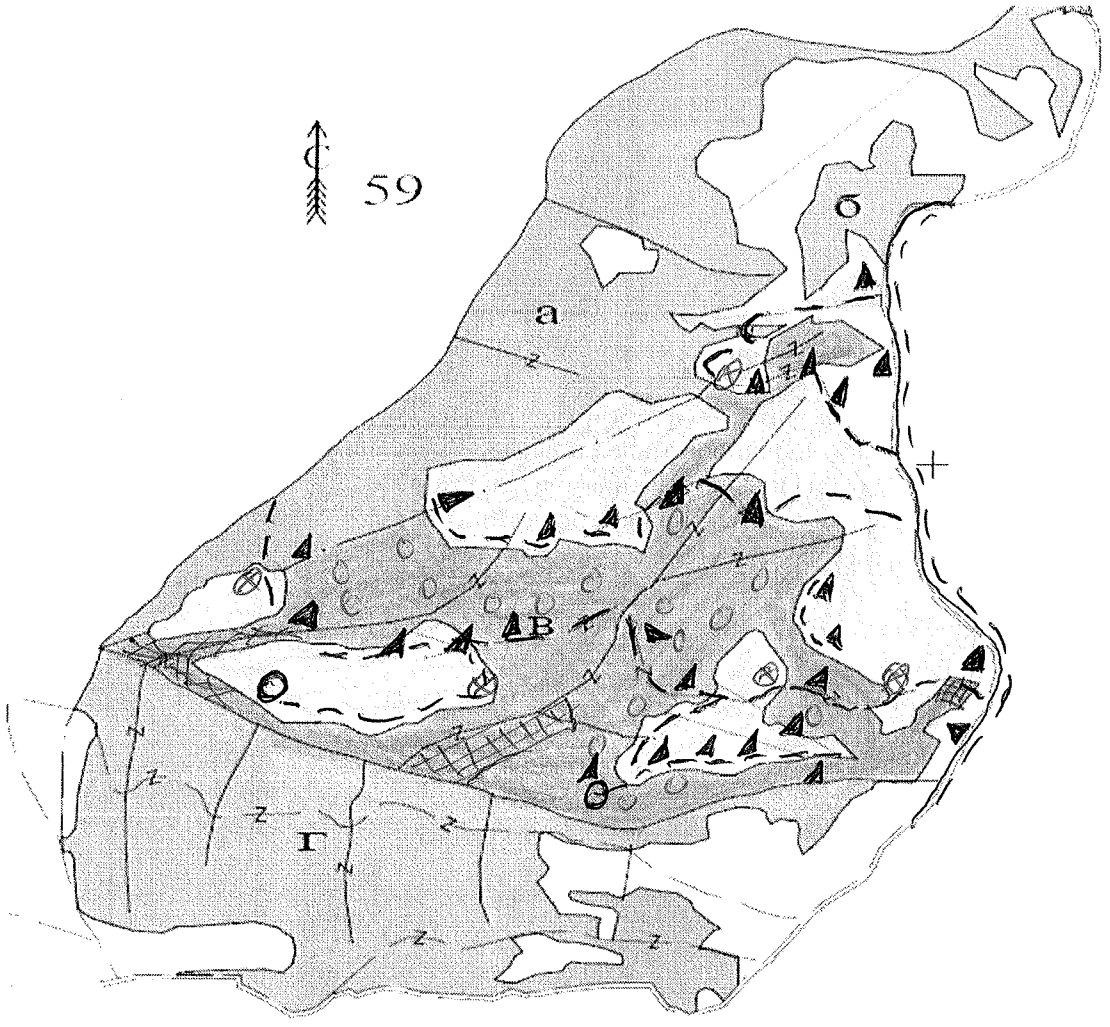

Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
========	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
0	котам
0	обръщало

»»»»»»—	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
ϴ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постепенно-котловинна от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **30%**
Втори вид сеч /интензивност %
2. Площ на подотдела **16,2** ха Размер на сечището **14,4** ха
3. Състав по план/програма **здб9 гбр1, бк** , действителен **здб9 гбр1, бк, кгбр, кл**
5. Запас на 1 ха : с клони **172** куб.м/ха , без клони **159** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **20** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **652** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	гбр	бк	кгбр	кл			дърв.вид категория	здб	гбр	бк	кгбр	кл			дърв.вид категория	здб кгбр кл
едра	19							дребна								вър-	
средна	13							дърва	533	56	22	8	1			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Подраста е предимно от зимен дъб и гбр, не всичкия е укрепнал.**

9. Средно извозно разстояние **до 150 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2 и 3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,~~ на временен склад~~) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца и моторно транспортно средство, изцяло натоварени** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортим.** **за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов. Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина
5. ~~Изграждане~~ и **ремонт на ~~временни извозни~~ автомобилни горски пътища**: **1500 м.**
5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина **м.** широчина 4 м.
5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м.,дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с остав. дървета и петната с подраст. При поваляне на правост. д-та и нараняване на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.
10. Начини за почистване на сечището **Събир. върхината на малки купчини разпол. в сечището, в страни**
11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазв. на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3". Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... ; подпис:.....; дата:.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ОДОБРИЛ,
ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Тракия":.....
/инж. Огнян Христов/

ПРОТОКОЛ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СМР. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА
ТП "ДЛС-Тракия" с. Стряма

Днес, 21.09.2020 г., комисия в състав:

1.инж. Христо Кюлеханов - гл.инженер ТП "ДЛС-Тракия";
2. Николай Стрехин - пом. лесничей;
3.Тодор Ризов - горски стражар,
4.....- .....

извърши проверка на място и установи следното:

В подотдел 59 "в" за усвояване на предвиденото количество дървесина по ГСП е необходимо да се извърши ремонт на горски път с дължина, както следва:

№ на участъка от пътя				1	5	6	Всичко:	разценка, лв.	стойност лв.
отдел № /участък/				59-в					
наклон на терена			%	42.4					
дължина на участъка			лм	1500			1500		
СМР									
1	изкоп машинно	прехвърляне на земни почви до 3м хоризонт.или 2м вертикално разстояние	куб.м.	280				3.98	1 114.40 лв.
2	Транспорт на булдозер		км	50				7.50	375 лв.
Общо:									**1 489.40 лв.**

Така изчислената сума е приспадната от стойността на обекта от промишления дърводобив, в който е включен подотдел 59-в и ще бъде предложен на втора тръжна сесия за 2021 г., чрез продажба на корен. При тези обстоятелства изграждането на пътища в обекта трябва да се осъществи от фирмата купувач на обекта и за нейна сметка.

Приложение: скица М 1:10000 на участъците от пътя с необходими СМР.

КОМИСИЯ:

1.....
2.....
3.....
4.....
