Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Георгиев - пом. лесничей при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 10.10.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **3375/25.05.2011 г.**

Одобрил:

име, фамилия,/ подпис:

дата: 03.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1218 / 23.03.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **64** подотдел **ж**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══════	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	ЧЕШМА
	обръщало

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
	място за зареждане на ГСМ
Θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постепенно-котловинна от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **30%**

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела **15.0** ха Размер на сечището **13.5** ха

3. Състав по план/програма **здб6 бк4 гбр трп** , действителен **здб6 бк4 гбр**

5. Запас на 1 ха : с клони **153** куб.м/ха , без клони **138** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **22** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **509** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	кг бр						дърв.вид категория	здб	бк	кгбр						дърв.вид категория	здб
едра	**12**	**18**							дребна									вър-	
средна	**7**	**19**							дърва	**156**	**281**	**16**						шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Подраста е от зимен дъб и гбр, не всич.е укрепнал. В долната част покрай дерето има и бк.**

9. Средно извозно разстояние **до 150 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2 и 3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,~~ на временен склад~~) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортим.**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина ____ м. широчина ____

5. ~~Изграждане~~ и **ремонт на** ~~временни извозни~~ **автомобилни горски пътища: 700 м.**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях ____ м (не по-малко от 40 м), дължина ____ м. широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях ____ м (не по-малко от 40 м),дължина ____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ____ бр.

допустимо разстояние между просеките ____ м.,дължин ____ м., широчина ____ м.

7. Направа на технологични просеки ____ бр.

допустимо разстояние между тях ____ м., дължина ____ м., широчина ____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране вършйната на малки купчини разпол. в сечището, в страни**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... ; подпис:.....; дата:.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ОДОБРИЛ,
ДИРЕКТОР ТП "ДЛС-Тракия" .....
/инж. Огнян Христов/

ПРОТОКОЛ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СМР, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ/РЕМОНТ НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА
ТП "ДЛС-Тракия" с. Стряма

Днес, 27.10.2020 г., комисия в състав:

1.инж. Христо Кюлеханов - гл.инженер ТП "ДЛС-Тракия";
2. Николай Стрехин - пом. лесничей;
3.Тодор Ризов - горски стражар,
4.....- .....

извърши проверка на място и установи следното:

В подотдел 64 "ж" за усвояване на предвиденото количество дървесина по ГСП е необходимо да се извърши ремонт на горски път с дължина във всеки подотдел, както следва:

№ на участъка от пътя				1	5	6	Всичко:	разценка, лв.	стойност лв.
отдел № /участък/				64-ж					
наклон на терена			%	48.7					
дължина на участъка			лм	700			700		
СМР									
1	изкоп машинно	прехвърляне на земни почви до 3м хоризонт.или 2м вертикално разстояние	куб.м.	126				3.98	501.48 лв.
Общо:									**501.48 лв.**

Приложение: скица М 1:10000 на участъците от пътя с необходими СМР.

КОМИСИЯ:

1.....
2.....
3.....
4.....

ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ТРАКИЯ"

СКИЦА

на проектираните ремонти на горски автомобилни и тракторни пътища

отд./подотд. **64 ж**

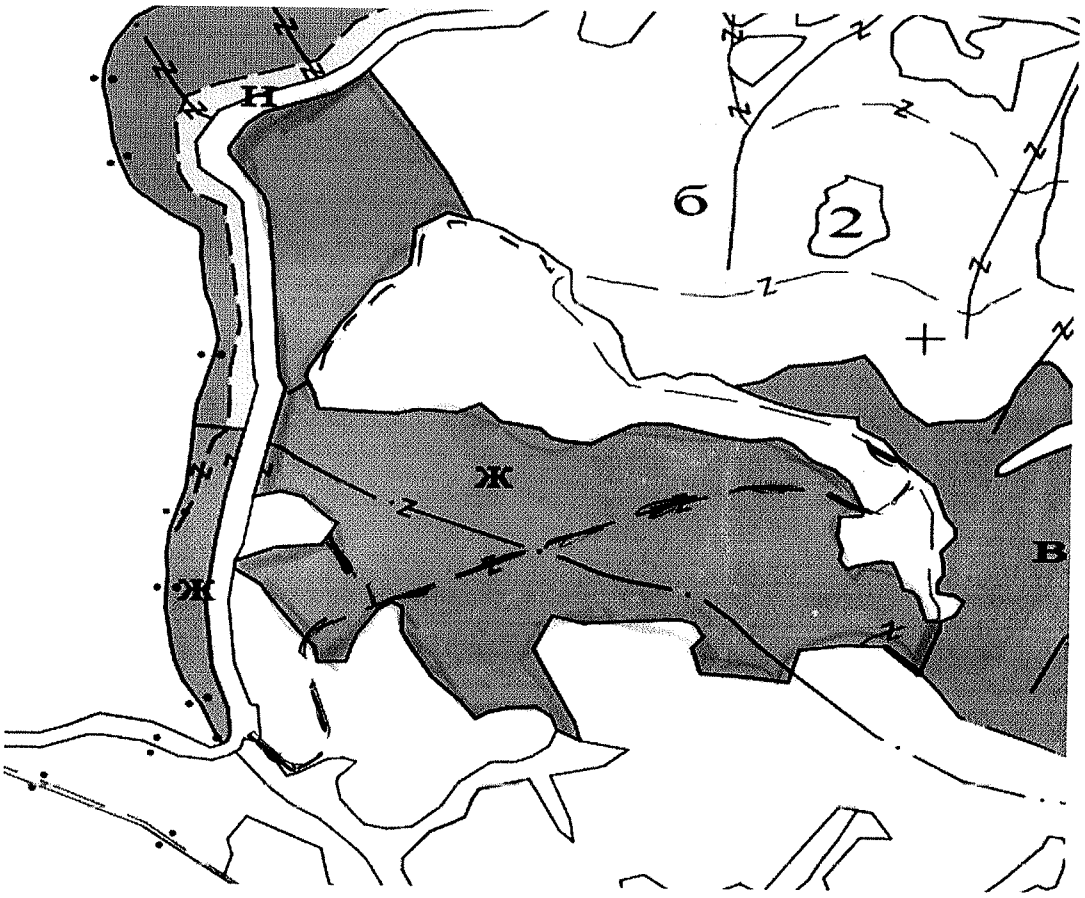

ЛЕГЕНДА:

- проектираните ремонти на съществуващи ГАП

- проектираните ремонти на съществуващи ГТП
